

สรุปรายละเอียดปริมาณน้ำในการส่งน้ำ จำนวน 4 รอบเวร

(รอบเวรเดือน กันยายน - ธันวาคม 68)

รอบเวร	รายละเอียด		
	ช่วงเวลา	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ล้าน ลบ.ม.)
กันยายน 2568	1 ก.ย. 68(09:00น.) – 17 ก.ย. 68(09:00น.)	26,956,800	26.957
ตุลาคม 2568	1 ต.ค. 68(09:00น.) – 17 ต.ค. 68(09:00น.)	26,956,800	26.957
พฤศจิกายน 2568	1 พ.ย. 68(09:00น.) – 17 พ.ย. 68(09:00น.)	26,956,800	26.957
ธันวาคม 2568	1 ธ.ค. 68(09:00น.) – 13 ธ.ค. 68(09:00น.)	20,217,600	20.218
รวมปริมาณน้ำที่ใช้ 4 รอบเวร		101,088,000	101.088

หมายเหตุ -

รายละเอียดแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวร " กันยายน 2568 "

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี (สำหรับผู้ปฏิบัติ)

รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน

ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (1 ก.ย. 68(09:00น.) - 9 ก.ย. 68(09:00น.))

ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว

ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (9 ก.ย. 68(09:00น.) - 17 ก.ย. 68(09:00น.))

ตั้งแต่ 1 ก.ย. 68(09:00น.) - 17 ก.ย. 68(09:00น.) รวมทั้งหมด 16 วัน

รวมใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด 26,956,800 ลบ.ม.

วัน/เดือน/ปี	เวลา	การปฏิบัติงาน	ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร / วินาที)
1 ก.ย. 68	09:00 น.	เริ่มส่งน้ำจากต้นคลองส่งน้ำสายใหญ่ (กม.0) ไปยังปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ (กม.66) (เริ่มต้นรอบเวร ก.ย. 68)	24 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
1 - 9 ก.ย. 68	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (8 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 (รับน้ำพร้อมกัน) โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค สระประปาหมู่บ้าน และสระน้ำสาธารณะ และพื้นที่เพาะปลูกตามแผนเพาะปลูก	24 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
9 ก.ย. 68	09:00 น.	ยุติการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 ปิดประตูน้ำอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.46 ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	-
9 - 17 ก.ย. 68	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (8 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 (รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว) โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค สระประปาหมู่บ้าน และสระน้ำสาธารณะ และพื้นที่เพาะปลูกตามแผนเพาะปลูก	15 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
17 ก.ย. 68	09:00 น.	ยุติการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 (สิ้นสุดการส่งน้ำรอบเวร ก.ย. 68)	-

ตอน 2 และ 4 (รับน้ำพร้อมกัน)

ตอน 3

รายละเอียดปริมาณน้ำที่ใช้ตามแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวร " กันยายน 2568 "

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี

รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน

ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (1 ก.ย. 68(09:00น.) - 9 ก.ย. 68(09:00น.))

ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว

ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (9 ก.ย. 68(09:00น.) - 17 ก.ย. 68(09:00น.))

ตั้งแต่ 1 ก.ย. 68(09:00น.) - 17 ก.ย. 68(09:00น.) รวมทั้งหมด 16 วัน

วัน / เดือน / ปี	จำนวน	อัตราการส่งน้ำ		พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำ
	(วัน)	ลบ.ม. / วินาที	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)	
1 - 9 ก.ย. 68	8	24	16,588,800	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4
9 - 17 ก.ย. 68	8	15	10,368,000	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3
รวม	16	-	26,956,800	-

หมายเหตุ

การส่งน้ำในรอบเวร กันยายน 2568 นี้ ขอให้ทำการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯ ตามลำดับ

โดยใช้การเปิดและปิดอาคารอัดน้ำกลางคลองในแต่ละช่วงเวลา ให้เป็นไปตามแผนการส่งน้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

แผนภูมิแสดงแผนการส่งน้ำในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งของอ่างเก็บน้ำปราณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

>>> รอบเวร กันยายน 2568



อ่างเก็บน้ำ
ปราณบุรี

อาคารประตูน้ำ
ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่
(Outlet)
(Qmax = 31.50 cms)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.1

ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน
ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 1 ก.ย. 68(09:00น.) - 9 ก.ย. 68(09:00น.)
> รวมส่งน้ำทั้งหมด 16 วัน
> รวมใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด
26,956,800 ลบ.ม.

ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว
ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 9 ก.ย. 68(09:00น.) - 17 ก.ย. 68(09:00น.)

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

(ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน)
ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 1 ก.ย. 68(09:00น.) - 9 ก.ย. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ สบ.2 นายจักรกฤษ ใต้เจริญงาม 061-1644461)

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

(ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว)
ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 9 ก.ย. 68(09:00น.) - 17 ก.ย. 68(09:00น.)


(พื้นที่รับผิดชอบ สบ.3 นายศุภก ฐมนโน 086-3978452)

โซฟอนลอคแม่น้ำกุยบุรี(Syphon)
(กม.48+785 - กม.49+036)

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

(ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน)
ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 1 ก.ย. 68(09:00น.) - 9 ก.ย. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ สบ.4 นายสัมพันธ์ นาคะเวช 089-2549017)

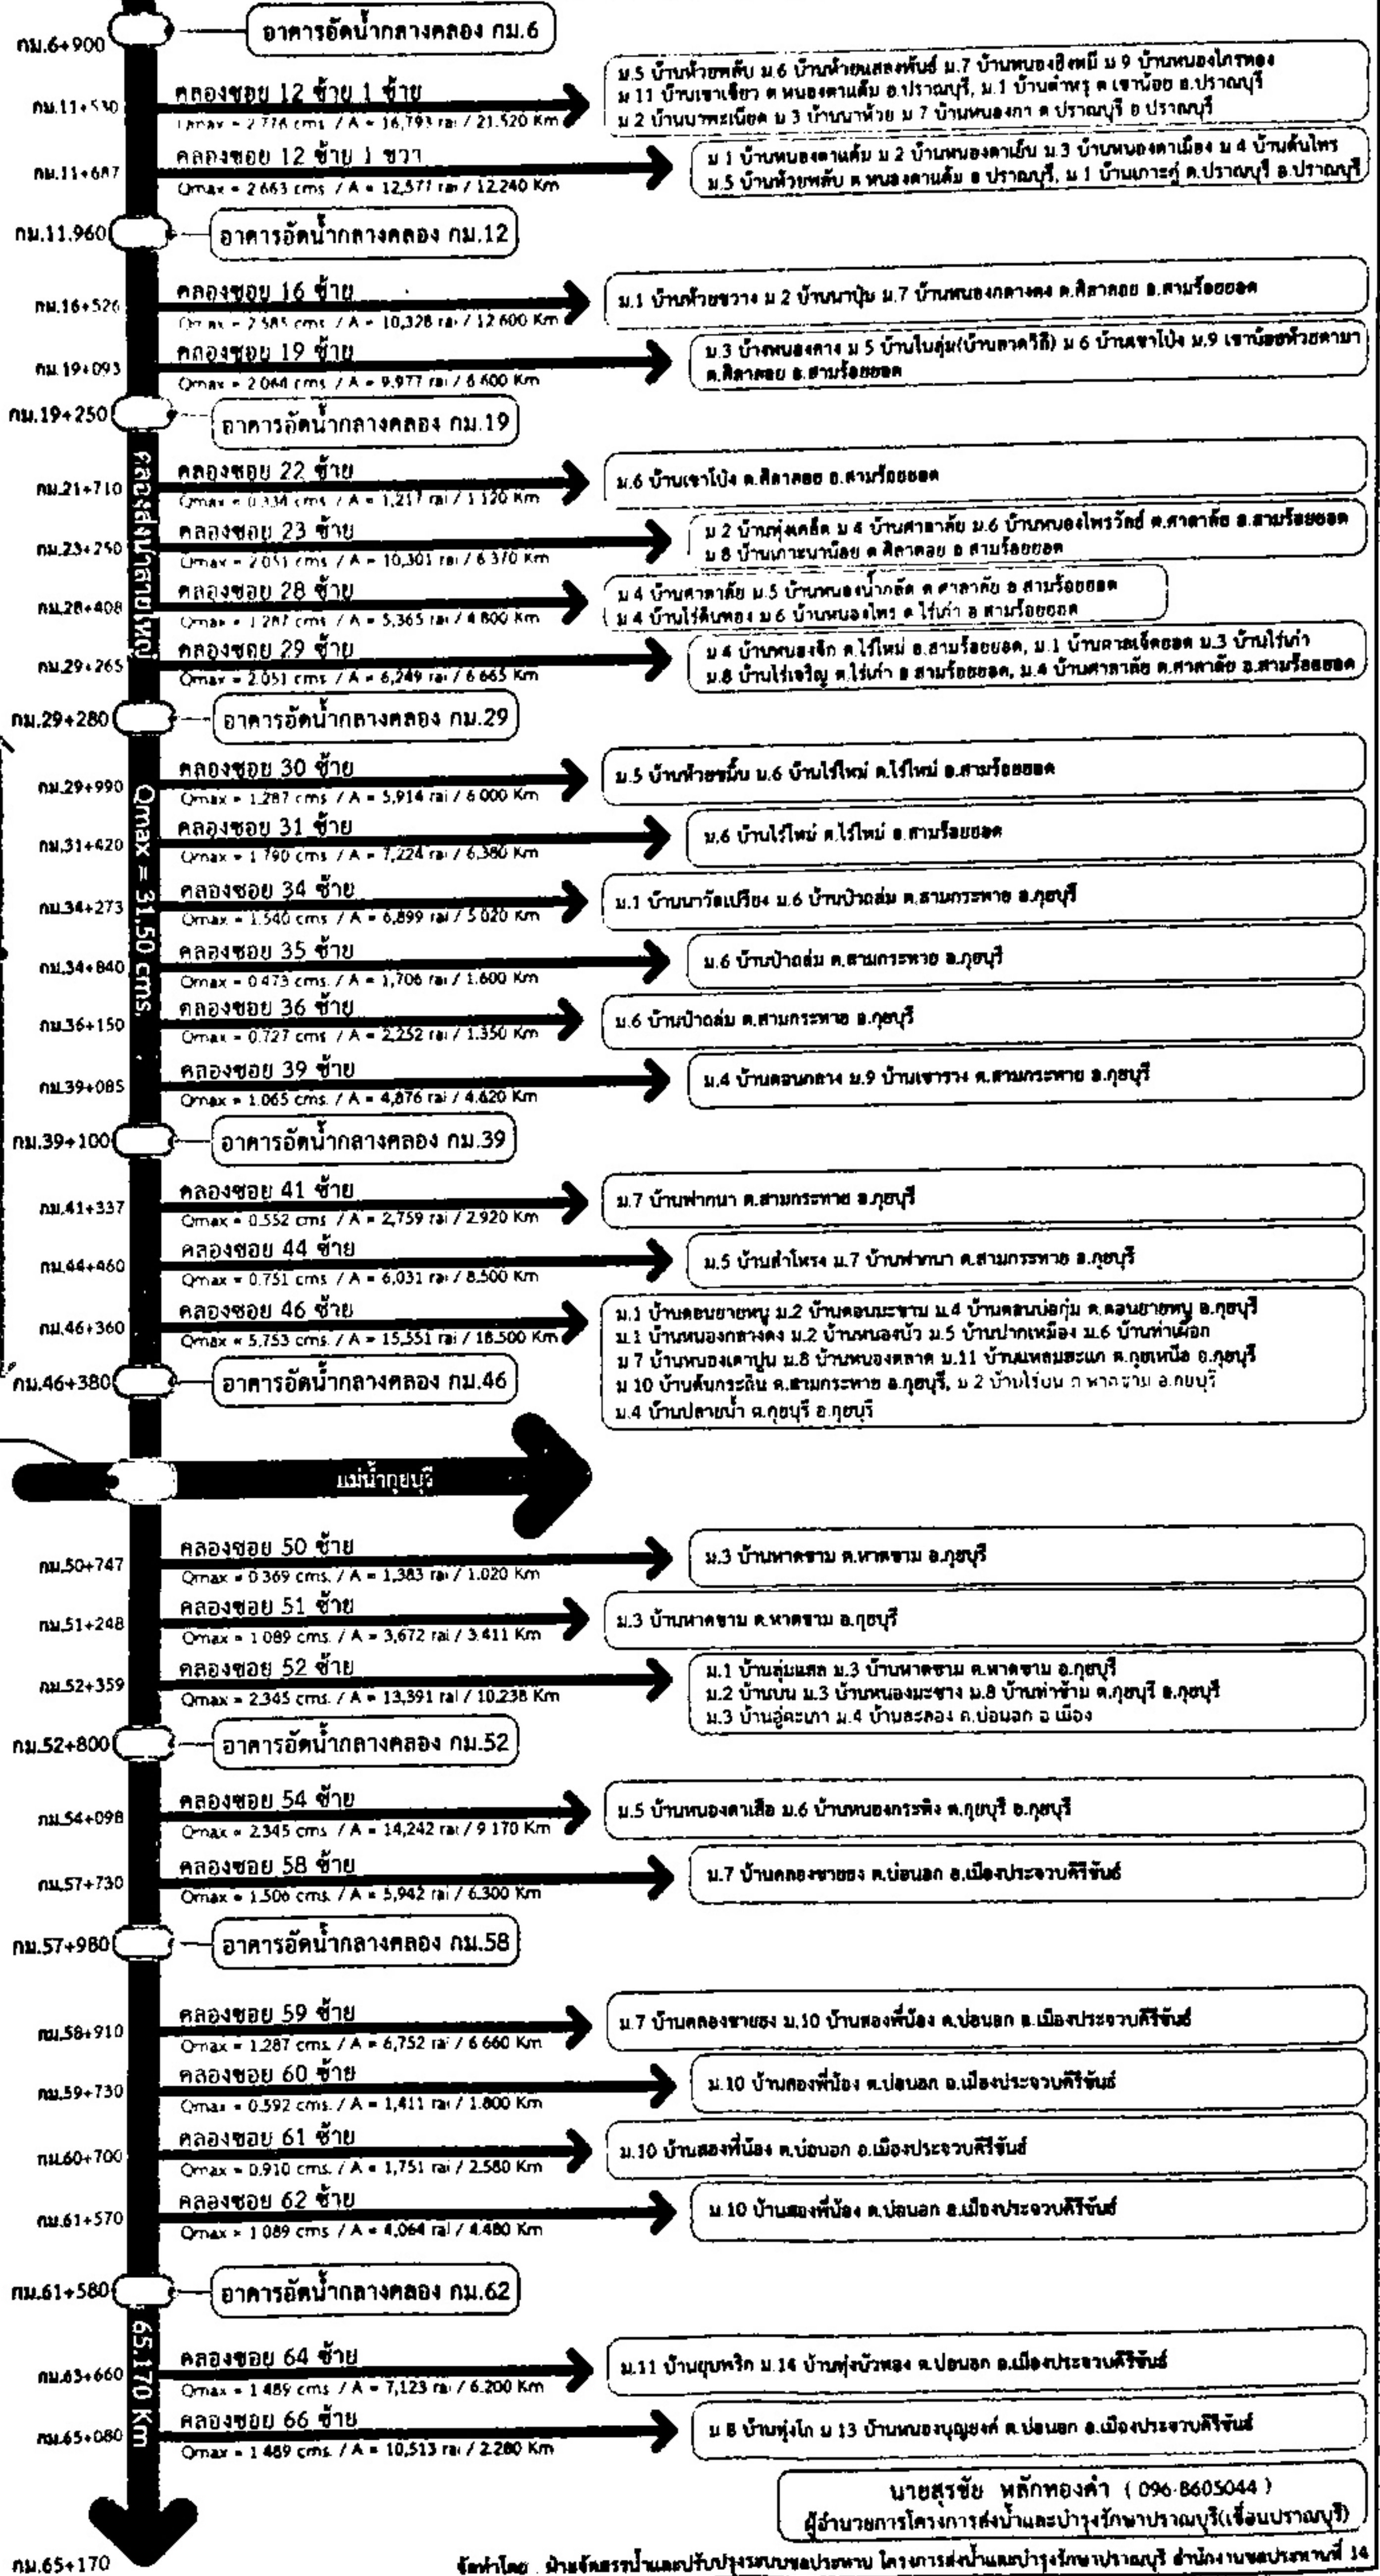

นายสุรัช พัทธพงศ์ (096-8605044)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (เขื่อนปราณบุรี)

นายศิริชัย อ่อนสมถ (081-9329778)
หัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน (เขื่อนปราณบุรี)

จัดทำโดย ฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14

รายละเอียดแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวร " ตุลาคม 2568 "

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี (สำหรับผู้ปฏิบัติ)

รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน

ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (1 ต.ค. 68(09:00น.) - 9 ต.ค. 68(09:00น.))

ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว

ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (9 ต.ค. 68(09:00น.) - 17 ต.ค. 68(09:00น.))

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68(09:00น.) - 17 ต.ค. 68(09:00น.) รวมทั้งหมด 16 วัน

รวมใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด 26,956,800 ลบ.ม.

วัน/เดือน/ปี	เวลา	การปฏิบัติงาน	ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร / วินาที)
1 ต.ค. 68	09:00 น.	เริ่มส่งน้ำจากต้นคลองส่งน้ำสายใหญ่ (กม.0) ไปยังปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ (กม.66) (เริ่มต้นรอบเวร ต.ค. 68)	24 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
1 - 9 ต.ค. 68	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (8 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 (รับน้ำพร้อมกัน) โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค สระประปาหมู่บ้าน และสระน้ำสาธารณะ และพื้นที่เพาะปลูกตามแผนเพาะปลูก	24 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
9 ต.ค. 68	09:00 น.	ยุติการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 ปิดประตูน้ำอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.46 ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	-
9 - 17 ต.ค. 68	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (8 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 (รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว) โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค สระประปาหมู่บ้าน และสระน้ำสาธารณะ และพื้นที่เพาะปลูกตามแผนเพาะปลูก	15 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
17 ต.ค. 68	09:00 น.	ยุติการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 (สิ้นสุดการส่งน้ำรอบเวร ต.ค. 68)	-

ตอน 2 และ 4 (รับน้ำพร้อมกัน)

ตอน 3

รายละเอียดปริมาณน้ำที่ใช้ตามแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวร " ตุลาคม 2568 "

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี

รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน

ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (1 ต.ค. 68(09:00น.) - 9 ต.ค. 68(09:00น.))

ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว

ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (9 ต.ค. 68(09:00น.) - 17 ต.ค. 68(09:00น.))

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68(09:00น.) - 17 ต.ค. 68(09:00น.) รวมทั้งหมด 16 วัน

วัน / เดือน / ปี	จำนวน	อัตราการส่งน้ำ		พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำ
	(วัน)	ลบ.ม. / วินาที	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)	
1 - 9 ต.ค. 68	8	24	16,588,800	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4
9 - 17 ต.ค. 68	8	15	10,368,000	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3
รวม	16	-	26,956,800	-

หมายเหตุ

การส่งน้ำในรอบเวร ตุลาคม 2568 นี้ ขอให้ทำการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำ ตามลำดับ

โดยใช้การเปิดและปิดอาคารอัดน้ำกลางคลองในแต่ละช่วงเวลา ให้เป็นไปตามแผนการส่งน้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

แผนภูมิแสดงแผนการส่งน้ำในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งของอ่างเก็บน้ำปรางบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี

>>> รอบเวร ฤดูแล้ง 2568




อ่างเก็บน้ำ
ปรางบุรี

อาคารประตูน้ำ
ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่
(Outlet)
(Qmax = 31.50 cms)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.1

ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน
ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68(09:00น.) - 9 ต.ค. 68(09:00น.)
> รวมส่งน้ำทั้งหมด 16 วัน
> รวมใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด 26,956,800 ลบ.ม.
>>> รอบเวร ฤดูแล้ง 2568
>>> รอบเวร ฤดูแล้ง 2568
>>> รอบเวร ฤดูแล้ง 2568

รวมส่งน้ำทั้งหมด 16 วัน
รวมใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด 26,956,800 ลบ.ม.

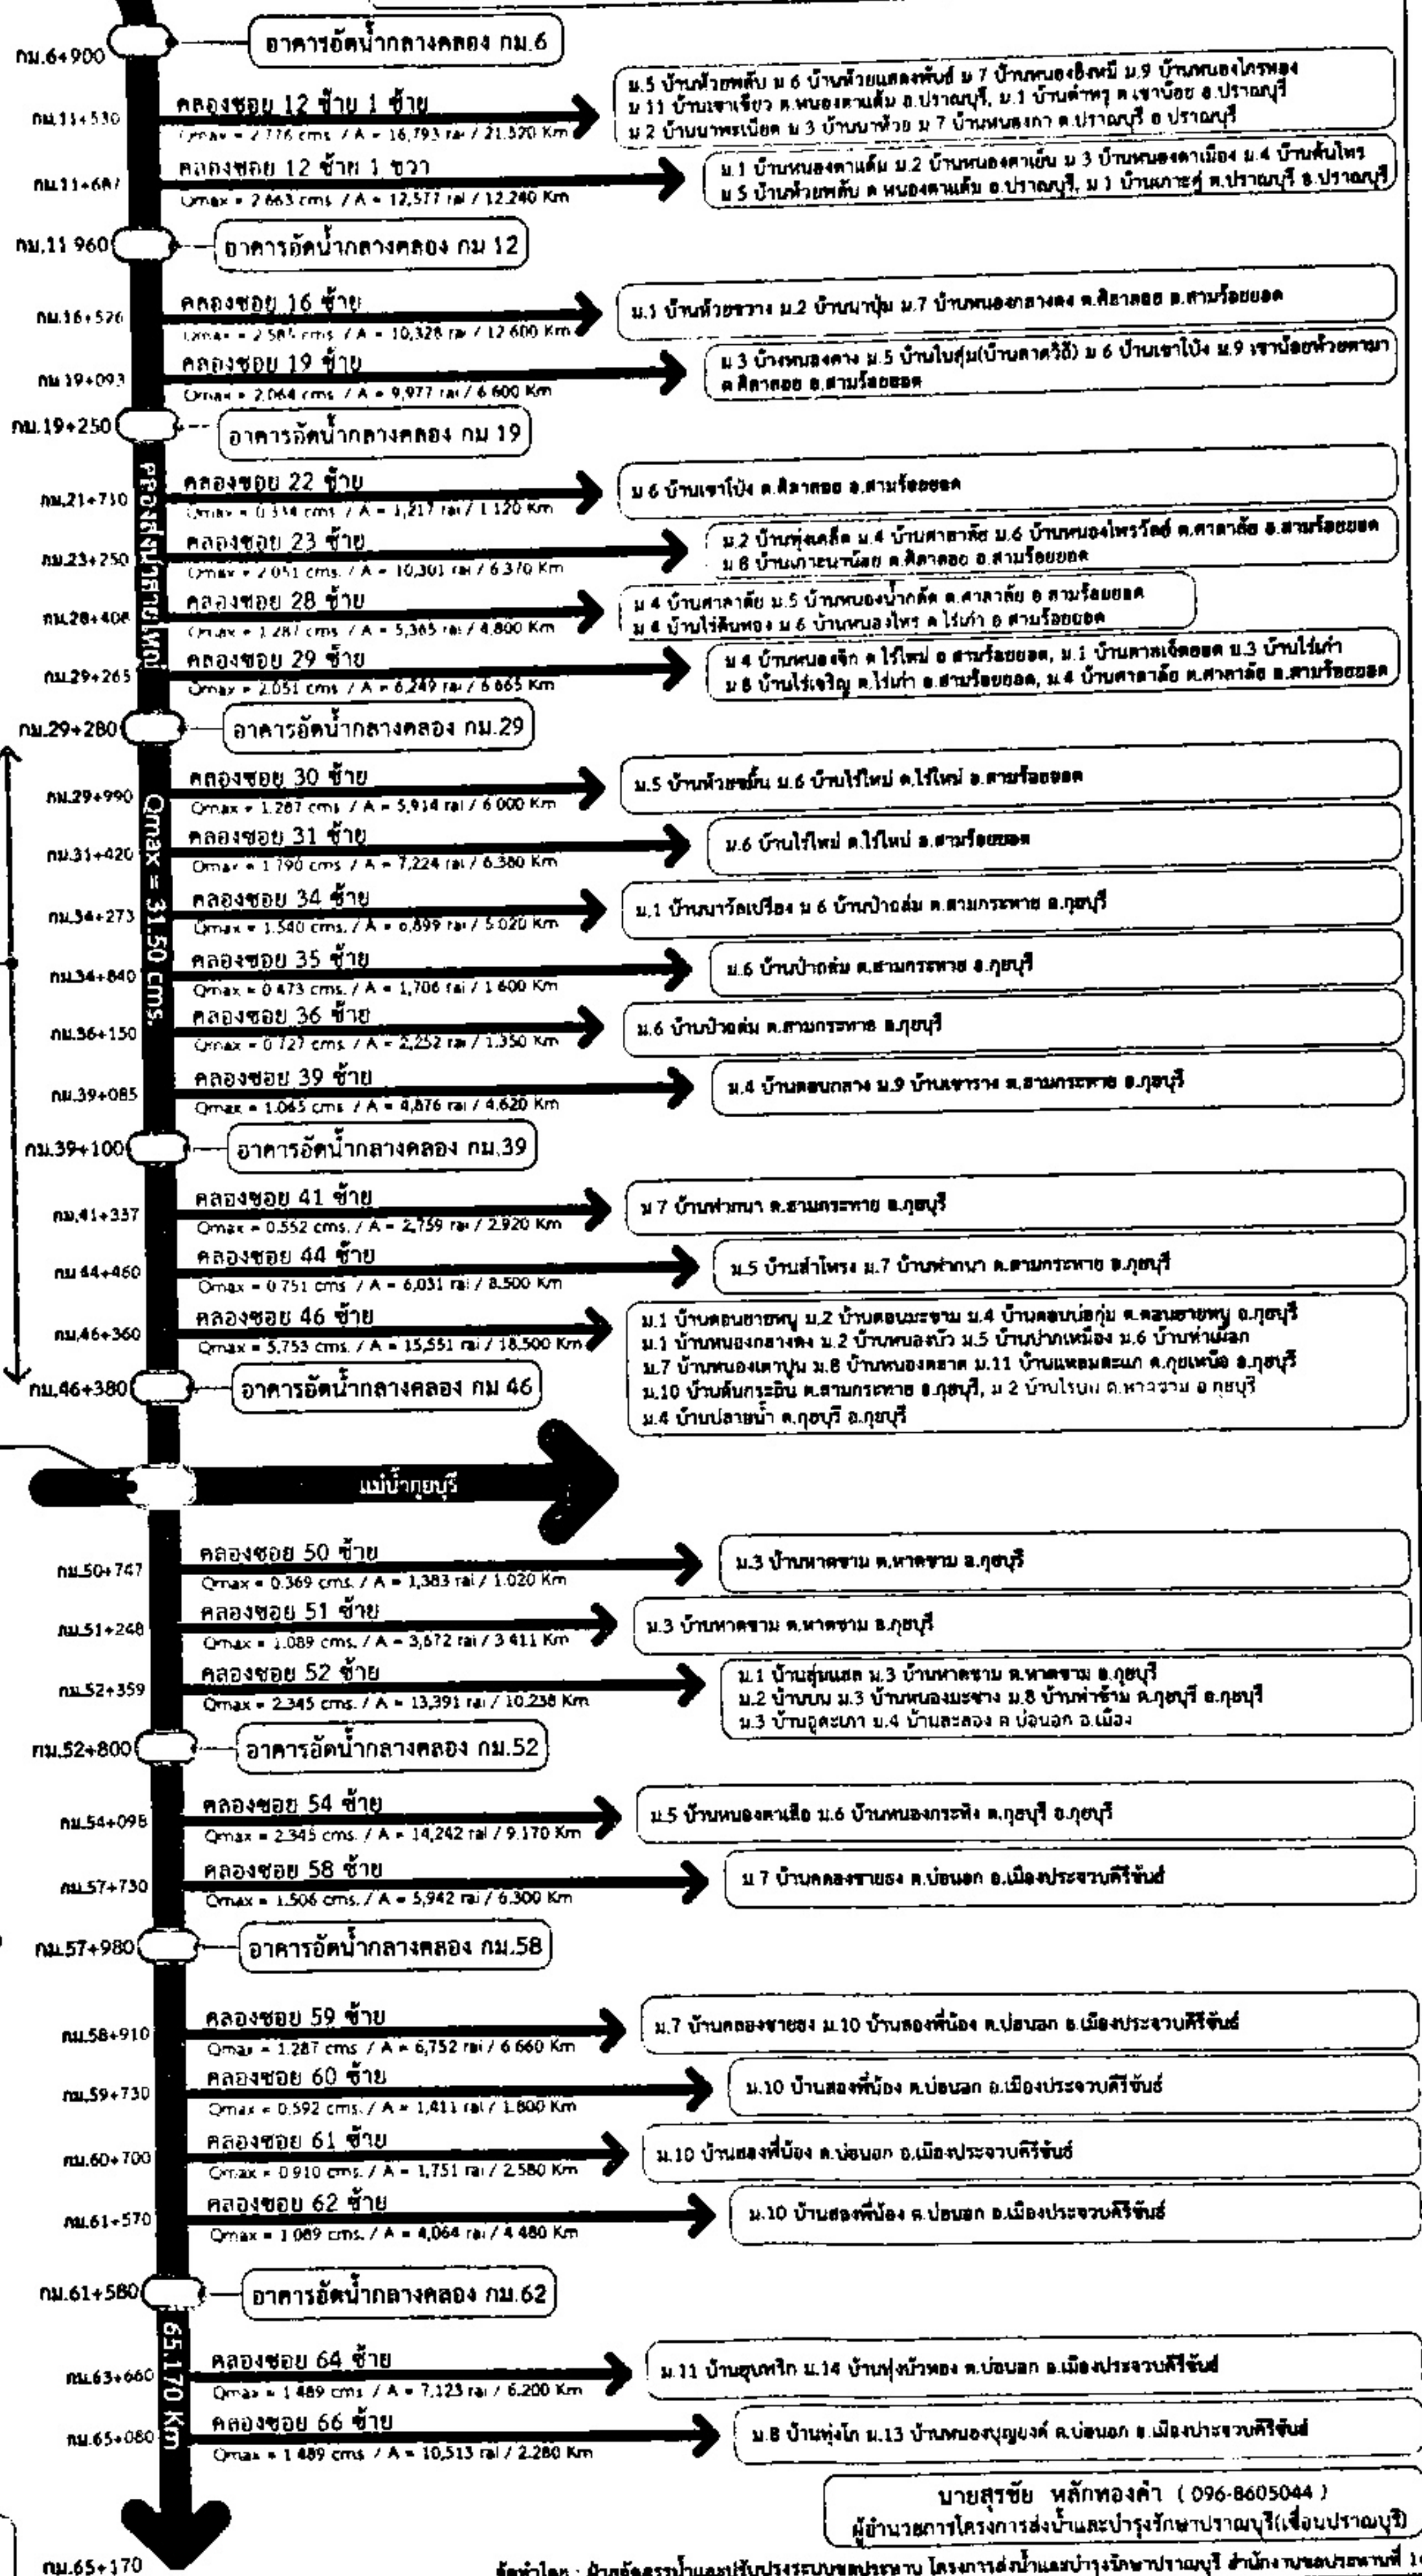

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

(ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน)
ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68(09:00น.) - 9 ต.ค. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ สบ.2 นายจักรกรฤกษ์ ใต้เจริญงาม 061-1644461)

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

(ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว)
ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 9 ต.ค. 68(09:00น.) - 17 ต.ค. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ สบ.3 นายสุกฤษ สุขะโน 086-3978452)

ไซฟอนลอดแม่น้ำกุยบุรี(Syphon)
(กม.48+785 - กม.49+036)

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

(ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน)
ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68(09:00น.) - 9 ต.ค. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ สบ.4 นายศักดิ์มนัส นาคะราช 089-2549017)

นายศิริชัย อ่อนสกล (081-9329778)
หัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน(เขื่อนปรางบุรี)

นายสุริชัย หลีกทองคำ (096-8605044)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี(เขื่อนปรางบุรี)

จัดทำโดย : ฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14

รายละเอียดแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวร " พุศจิกายน 2568 "

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมุนี (สำหรับผู้ปฏิบัติ)

รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน

ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (1 พ.ย. 68(09:00น.) - 9 พ.ย. 68(09:00น.))

ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว

ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (9 พ.ย. 68(09:00น.) - 17 พ.ย. 68(09:00น.))

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 68(09:00น.) - 17 พ.ย. 68(09:00น.) รวมทั้งหมด 16 วัน

รวมใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด 26,956,800 ลบ.ม.

วัน/เดือน/ปี	เวลา	การปฏิบัติงาน	ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร / วินาที)
1 พ.ย. 68	09:00 น.	เริ่มส่งน้ำจากต้นคลองส่งน้ำสายใหญ่ (กม.0) ไปยังปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ (กม.66) (เริ่มต้นรอบเวร พ.ย. 68)	24 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
1 - 9 พ.ย. 68	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (8 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 (รับน้ำพร้อมกัน) โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค สระประปาหมู่บ้าน และสระน้ำสาธารณะ และพื้นที่เพาะปลูกตามแผนเพาะปลูก	24 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
9 พ.ย. 68	09:00 น.	ยุติการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 ปิดประตูน้ำอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.46 ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	-
9 - 17 พ.ย. 68	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (8 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 (รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว) โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค สระประปาหมู่บ้าน และสระน้ำสาธารณะ และพื้นที่เพาะปลูกตามแผนเพาะปลูก	15 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
17 พ.ย. 68	09:00 น.	ยุติการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 (สิ้นสุดการส่งน้ำรอบเวร พ.ย. 68)	-

ตอน 2 และ 4 (รับน้ำพร้อมกัน)

ตอน 3

รายละเอียดปริมาณน้ำที่ใช้ตามแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวร " พุทธศักราช 2568 "

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี

รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน

ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (1 พ.ย. 68(09:00น.) - 9 พ.ย. 68(09:00น.))

ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว

ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน (9 พ.ย. 68(09:00น.) - 17 พ.ย. 68(09:00น.))

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 68(09:00น.) - 17 พ.ย. 68(09:00น.) รวมทั้งหมด 16 วัน

วัน / เดือน / ปี	จำนวน	อัตราการส่งน้ำ		พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำ
	(วัน)	ลบ.ม. / วินาที	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)	
1 - 9 พ.ย. 68	8	24	16,588,800	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4
9 - 17 พ.ย. 68	8	15	10,368,000	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3
รวม	16	-	26,956,800	-

หมายเหตุ

การส่งน้ำในรอบเวร พุทธศักราช 2568 นี้ ขอให้ทำการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำ ตามลำดับ

โดยใช้การเปิดและปิดอาคารอัดน้ำกลางคลองในแต่ละช่วงเวลา ให้เป็นไปตามแผนการส่งน้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

อ่างเก็บน้ำ
ปราณบุรี

อาคารประตูน้ำ
ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่
(Outlet)
($Q_{max} = 31.50 \text{ cms}$)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ

ผาแดงงน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกับ

สงวนที่อัตรา 24 คบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 68(09:00น.) - 9 พ.ย. 68(09:00น.)

๒. งานส่งน้ำทั้งหมด 16 วัน

ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว

> รวมใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด
26.956.800 ลบ.ม.

ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ ๑ พ.ย. 68(09:00น.) - 17 พ.ย. 68(09:00น.)

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

(ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน)
ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 68(09:00น.) - 9 พ.ย. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ ต.2 นายจักรกฤษณ์ ได้แจ้งโรงงาน 061-1644461)

พื้นที่ผ่านส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 8 วัน
ตั้งแต่ 9 พ.ย. 68(09:00น.) - 17 พ.ย. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ สป.3 นายสกุล ชูมะโน 086-3978452)

ไซฟอนตอตแมงน้ำกฤษบุรี(Syphon)
(กม.48+785 - กม.49+036)

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ ไร่/วัน จำนวน 8 ไร่
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 68(09:00น.) - 9 พ.ย. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ สป.4 นายสัมพันธ์ นาคะเวช 089-2549017)

นายพิชัย อ่อนสกต (๐๐1-9329778)

ผู้ว่าฯ ฝ่าฝืนข้อควรระวังฉบับใหม่ของกรม(เพื่อความปลอดภัย)

นายสรชัย หลักทองคำ (096-8605044)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์

จัดทำโดย ฝ่ายจัดการทรัพยากรบุคคลกับงานระบบคอมพิวเตอร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางค์บุรี สำนักงานชลประทานที่ 16

รายละเอียดแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวร " ธันวาคม 2568 "

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี (สำหรับปฏิบัติ)

รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน

ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 6 วัน (1 ธ.ค. 68(09:00น.) - 7 ธ.ค. 68(09:00น.))

ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว

ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 6 วัน (7 ธ.ค. 68(09:00น.) - 13 ธ.ค. 68(09:00น.))

ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 68(09:00น.) - 13 ธ.ค. 68(09:00น.) รวมทั้งหมด 12 วัน

รวมใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด 20,217,600 ลบ.ม.

วัน/เดือน/ปี	เวลา	การปฏิบัติงาน	ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร / วินาที)
1 ธ.ค. 68	09:00 น.	เริ่มส่งน้ำจากต้นคลองส่งน้ำสายใหญ่ (กม.0) ไปยังปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ (กม.66) (เริ่มต้นรอบเวร ธ.ค. 68)	24 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
1 - 7 ธ.ค. 68	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (6 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 (รับน้ำพร้อมกัน) โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค สระประปาหมู่บ้าน และสระน้ำสาธารณะ และพื้นที่เพาะปลูกตามแผนเพาะปลูก	24 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
7 ธ.ค. 68	09:00 น.	ยุติการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 ปิดประตูน้ำอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.46 ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	-
7 - 13 ธ.ค. 68	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (6 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 (รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว) โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค สระประปาหมู่บ้าน และสระน้ำสาธารณะ และพื้นที่เพาะปลูกตามแผนเพาะปลูก	15 ลบ.ม. ต่อ วินาที สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
13 ธ.ค. 68	09:00 น.	ยุติการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 (สิ้นสุดการส่งน้ำรอบเวร ธ.ค. 68)	-

ตอน 2 และ 4 (รับน้ำพร้อมกัน)

ตอน 3

รายละเอียดปริมาณน้ำที่ใช้ตามแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวร " ธันวาคม 2568 "

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี

รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน

ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 6 วัน (1 ธ.ค. 68(09:00น.) - 7 ธ.ค. 68(09:00น.))

ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว

ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 6 วัน (7 ธ.ค. 68(09:00น.) - 13 ธ.ค. 68(09:00น.))

ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 68(09:00น.) - 13 ธ.ค. 68(09:00น.) รวมทั้งหมด 12 วัน

วัน / เดือน / ปี	จำนวน (วัน)	อัตราการส่งน้ำ		พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำ
		ลบ.ม. / วินาที	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)	
1 - 7 ธ.ค. 68	6	24	12,441,600	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4
7 - 13 ธ.ค. 68	6	15	7,776,000	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3
รวม	12	-	20,217,600	-

หมายเหตุ การส่งน้ำในรอบเวร ธันวาคม 2568 นี้ ขอให้ทำการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำ ตามลำดับ

โดยใช้การเปิดและปิดอาคารอัดน้ำกลางคลองในแต่ละช่วงเวลา ให้เป็นไปตามแผนการส่งน้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

แผนภูมิแสดงแผนการส่งน้ำในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งของอ่างเก็บน้ำปรางบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี

>>> รอบเวร ธันวาคม 2568




อ่างเก็บน้ำ
ปรางบุรี

อาคารประตูน้ำ
ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่
(Outlet)
(Qmax = 31.50 cms)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.1

ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน
ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 6 วัน
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 68(09:00น.) - 7 ธ.ค. 68(09:00น.)
> รวมส่งน้ำทั้งหมด 12 วัน
> รวมใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด 20,217,600 ลบ.ม.

ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว
ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 6 วัน
ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 68(09:00น.) - 13 ธ.ค. 68(09:00น.)

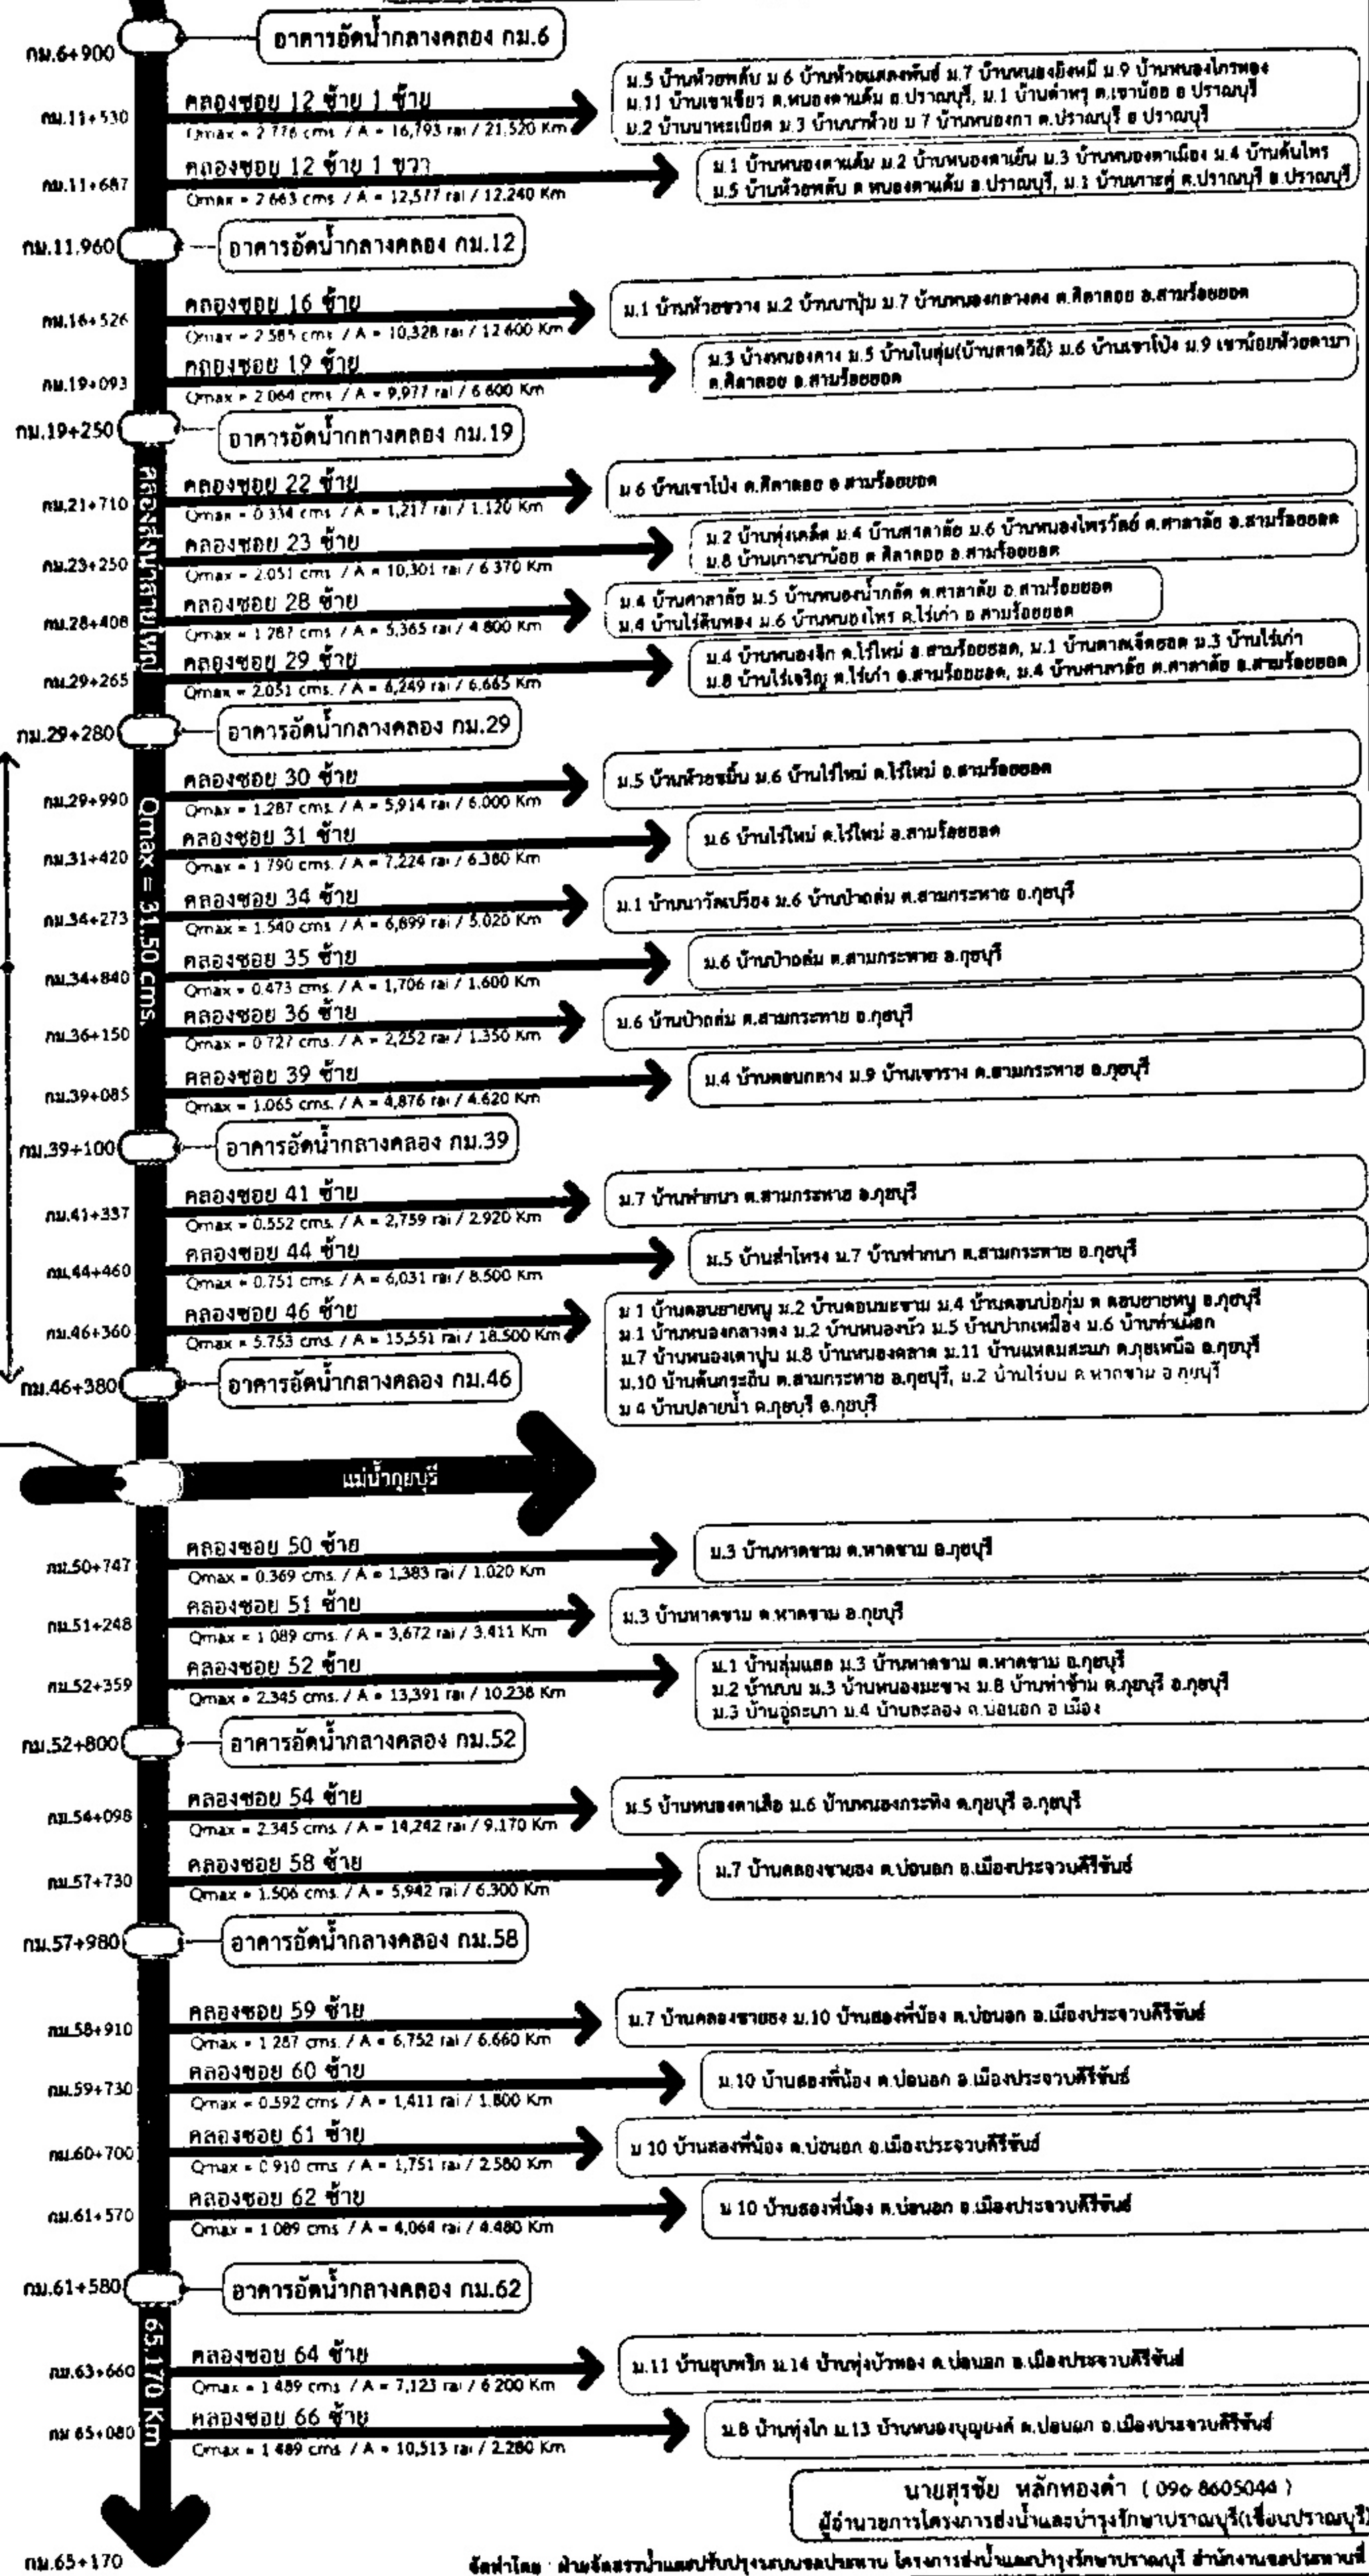

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

(ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน)
ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 6 วัน
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 68(09:00น.) - 7 ธ.ค. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ สบ.2 นายจักรกฤษ ใต้เจริญงาม 061-1644461)

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

(ต่อด้วยฝ่ายส่งน้ำที่ 3 รับน้ำเพียงฝ่ายเดียว)
ส่งน้ำที่อัตรา 15 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 6 วัน
ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 68(09:00น.) - 13 ธ.ค. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ สบ.3 นายสกุล สมะโน 086-3978452)

ไซฟอนลอดแม่น้ำกุยบุรี(Syphon)
(กม.48+785 - กม.49+036)

พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

(ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 และ 4 รับน้ำพร้อมกัน)
ส่งน้ำที่อัตรา 24 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 6 วัน
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 68(09:00น.) - 7 ธ.ค. 68(09:00น.)

(พื้นที่รับผิดชอบ สบ.4 นายฉัตรพนม นาคะวาช 089-2549017)

นายศิริชัย อ่อนสกล (081-9329778)

หัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน(เขื่อนปรางบุรี)

นายสุรชัย หลักทองคำ (090-8605044)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี(เขื่อนปรางบุรี)

จัดทำโดย ฝ่ายจัดการน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
